distec
10 rue Beau de Rochas - 63110 Beaumont
Tél : 04.73.28.01.01 - Fax : 04.73.28.03.30

PLANNING ENVELOPPE PHASE DCE LOTS ANTICIPES (VRD-GO)
CENTRE JEAN PERRIN

Date : 16 avril 2009
Indice - 0
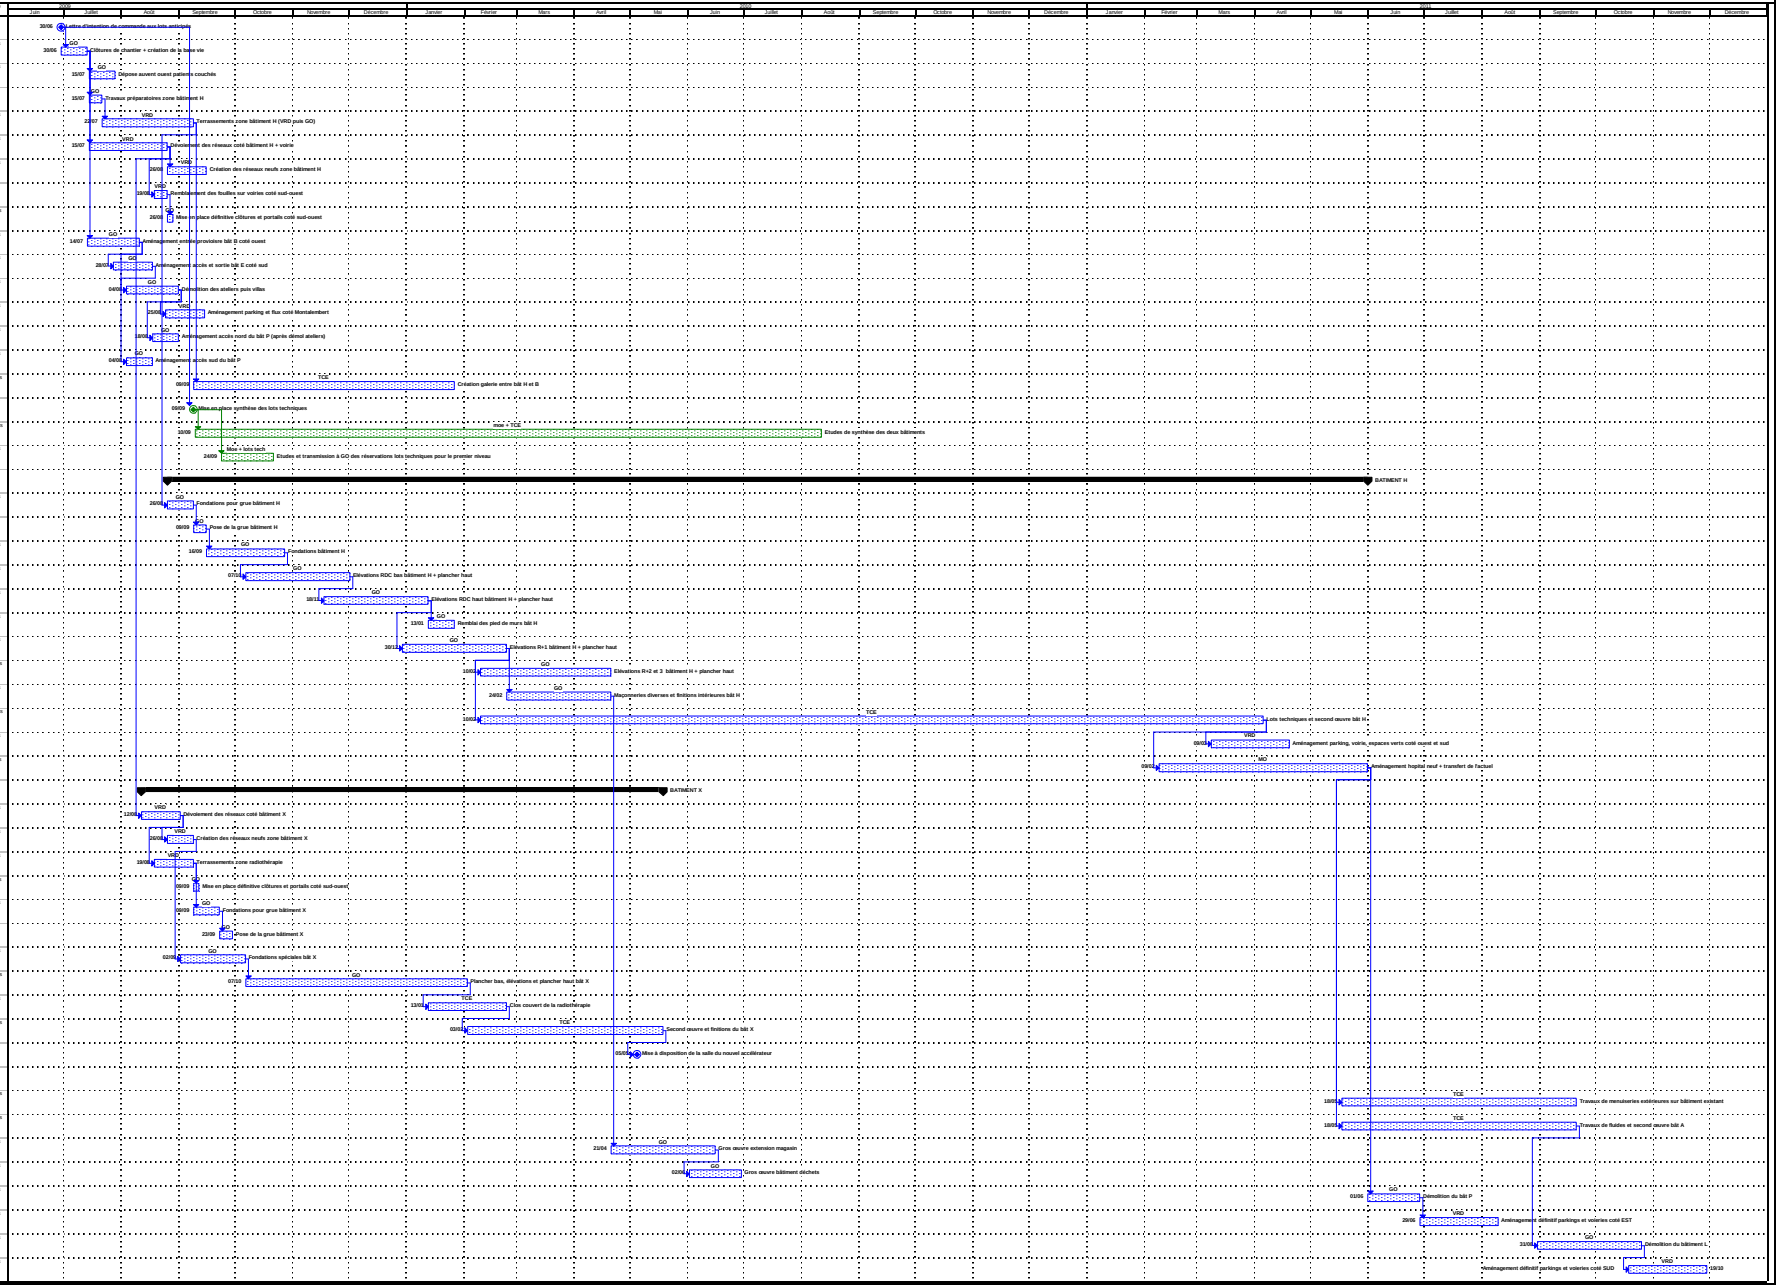
N°	Nom de la tâche	Durée
1	Lettre d'intention de commande aux lots anticipés	1 jour
2	Clôtures de chantier + création de la base vie	2 sems
3	Dépose auvent ouest patients couchés	2 sems
4	Travaux préparatoires zone bâtiment H	1 sem
5	Terrassements zone bâtiment H (VRD puis GO)	7 sems
6	Dévoiement des réseaux coté bâtiment H + voirie	6 sems
7	Création des réseaux neufs zone bâtiment H	3 sems
8	Remblaiement des fouilles sur voiries coté sud-ouest	1 sem
9	Mise en place définitive clôtures et portails coté sud-ouest	3 jours
10	Aménagement entrée provisoire bât B coté ouest	4 sems
11	Aménagement accès et sortie bât E coté sud	3 sems
12	Démolition des ateliers puis villas	4 sems
13	Aménagement parking et flux coté Montalembert	3 sems
14	Aménagement accès nord du bât P (après démol ateliers)	2 sems
15	Aménagement accès sud du bât P	2 sems
16	Création galerie entre bât H et B	20 sems
17	Mise en place synthèse des lots techniques	1 jour
18	Etudes de synthèse des deux bâtiments	12 mois
19	Etudes et transmission à GO des réservations lots techniques pour le premier niveau	4 sems
20	**BATIMENT H**	400 jours
21	Fondations pour grue bâtiment H	2 sems
22	Pose de la grue bâtiment H	1 sem
23	Fondations bâtiment H	6 sems
24	Elévations RDC bas bâtiment H + plancher haut	8 sems
25	Elévations RDC haut bâtiment H + plancher haut	8 sems
26	Remblai des pied de murs bât H	2 sems
27	Elévations R+1 bâtiment H + plancher haut	8 sems
28	Elévations R+2 et 3 bâtiment H + plancher haut	10 sems
29	Maçonneries diverses et finitions intérieures bât H	8 sems
30	Lots techniques et second oeuvre bât H	15 mois
31	Aménagement parking, voirie, espaces verts coté ouest et sud	6 sems
32	Aménagement hopital neuf + transfert de l'actuel	4 mois
33	**BATIMENT X**	200 jours
34	Dévoiement des réseaux coté bâtiment X	3 sems
35	Création des réseaux neufs zone bâtiment X	2 sems
36	Terrassements zone radiothérapie	3 sems
37	Mise en place définitive clôtures et portails coté sud-ouest	3 jours
38	Fondations pour grue bâtiment X	2 sems
39	Pose de la grue bâtiment X	1 sem
40	Fondations spéciales bât X	5 sems
41	Plancher bas, élévations et plancher haut bât X	17 sems
42	Clos couvert de la radiothérapie	6 sems
43	Second oeuvre et finitions du bât X	15 sems
44	Mise à disposition de la salle du nouvel accélérateur	1 jour
45		
46	Travaux de menuiseries extérieures sur bâtiment existant	18 sems
47	Travaux de fluides et second oeuvre bât A	18 sems
48	Gros oeuvre extension magasin	8 sems
49	Gros oeuvre bâtiment déchets	4 sems
50	Démolition du bât P	4 sems
51	Aménagement définitif parkings et voieries coté EST	6 sems
52	Démolition du bâtiment L	8 sems
53	Aménagement définitif parkings et voieries coté SUD	6 sems
